



# HOTEL DE VILLE

TRANSFORMATIONS LOURDES



## INTERVENANTS

### DIRECTION DES TRAVAUX

Bonhôte & Zapata  
Architectes

### ARCHITECTES

Bonhôte & Zapata  
Architectes

### INGENIEURS CIVILS

B. Ott & C. Uldry

### MAITRE DE L'OUVRAGE

Ville de Genève - Service  
OBA

### REALISATION

MAULINI SA

## DESCRIPTIF DE L'OBJET

Rénovation totale et mise en conformité du bâtiment de l'Hôtel de Ville de Genève : démolitions intérieures dalles et murs, reprise en sous-œuvre.

Réfection des salles du Grand Conseil, monuments et sites sous la supervision de l'Office Cantonal des Bâtiments et de la CNMS.

Application d'un enduit au chiffon, lissé à la bouteille et finition frotté fin.



## CHIFFRES CLES

### PÉRIODE DES TRAVAUX

Juillet 2018 - Décembre 2021

### DURÉE DES TRAVAUX

42 mois

### MONTANT DES TRAVAUX

2'250'000 CHF

### VOLUME DU BETON MIS EN PLACE

273 m<sup>3</sup>

### ARMATURE MISE EN PLACE

19 to



## LOCALISATION

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 -  
Genève




## MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation. Le recyclage du béton issu des travaux de démolition a quant à lui été utilisé pour la réalisation de bétons maigres d'enrobage.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.

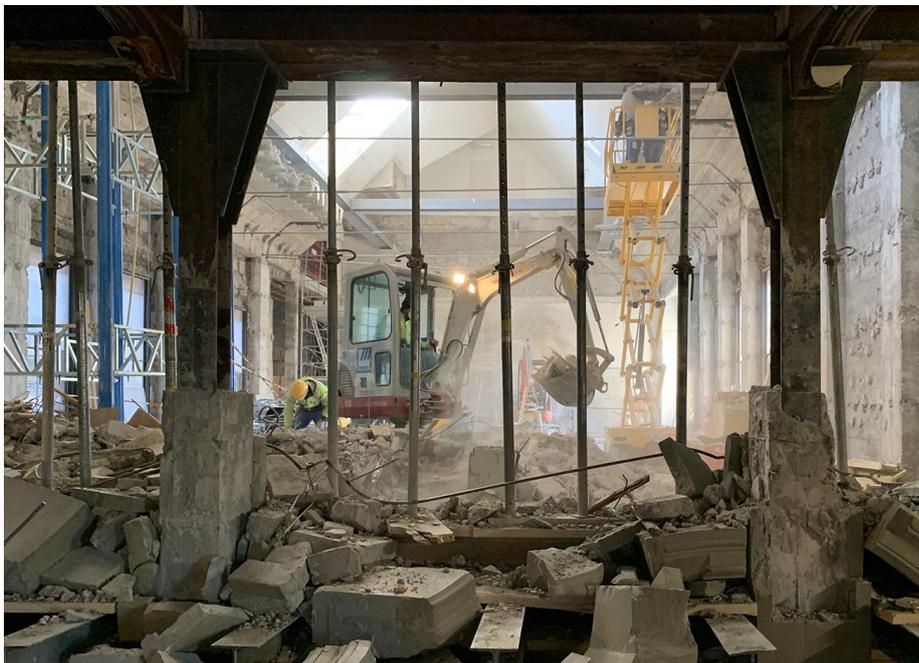

## RESSOURCES

### HUMAINES :

1 contremaitre

6 ouvriers

### MATÉRIELLES :

1 grue Liebherr type 81K

1 petite pompe à béton

1 Pelle

MAULINI SA  
25B route du Bois de  
Bay  
CH - 1242 SATIGNY  
T +41 22 939 39 10  
info@maulini.ch

